


**PRÉSENTATION DES TRAVAUX SUR LA RD 117, GIRATOIRE MERMOZ  
AMÉNAGEMENT D'UN CARREFOUR GIRATOIRE AU CROISEMENT DE LA ROCADE OUEST  
ET DE LA RUE JEAN MERMOZ**

**RÉUNION PUBLIQUE  
MERCREDI 12 AVRIL 2023 A 20H00**

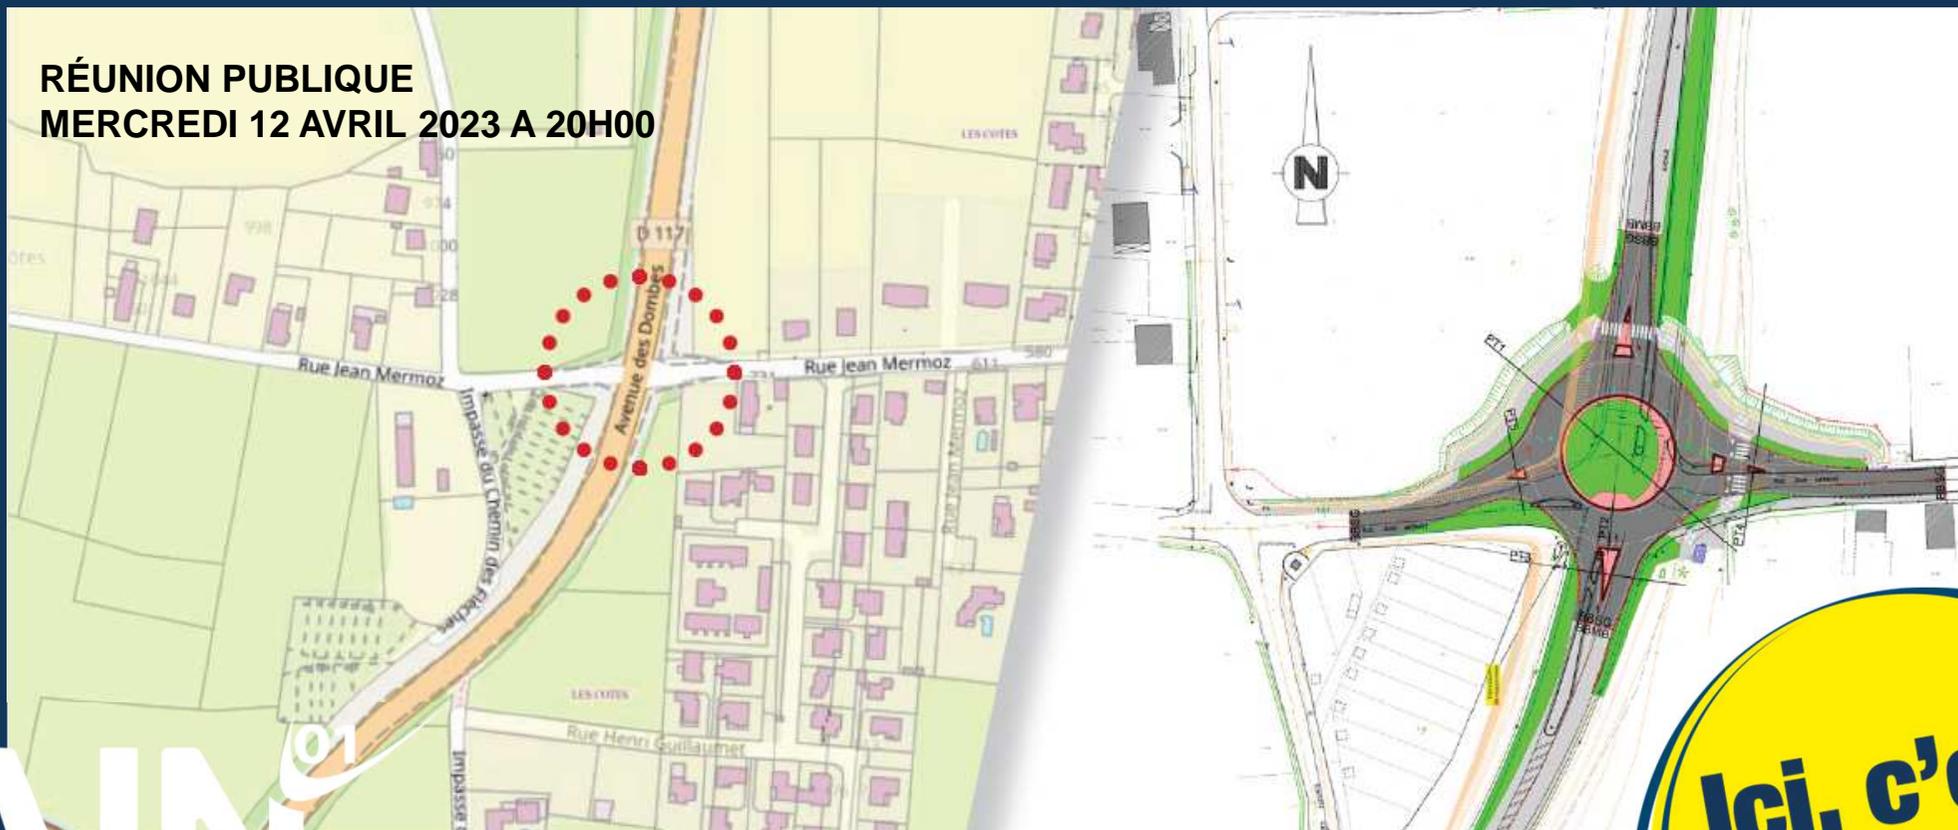

## Déroulement de la réunion

- 20h00**      **M. Guillaume Fauvet**, Maire de Saint-Denis-lès-Bourg, 4<sup>ème</sup> Vice-Président de Grand Bourg Agglomération, délégué à la stratégie territoriale et au foncier
- 20h10**      **M. Bruno Raffin**, Conseiller de Grand Bourg Agglomération, délégué à la voirie, Maire de Coligny
- 20h20**      **Mme Hélène Cédileau**, Maire de Péronnas, Conseillère départementale de Bourg-en-Bresse 2, Vice-présidente du Département de l'Ain, déléguée aux ressources humaines et aux sports  
Présentation du contexte et des enjeux
- 20h40**      Présentation de l'opération : **M. Didier Dubourgnon**, chargé d'opérations – Service routes aménagement – Direction des routes - Département de l'Ain  
  
Présentation du projet, du planning et du séquençage des travaux
- 21h15**      Questions – réponses
- Conclusion    **M. Guy Billoudet**, Vice-Président du Département de l'Ain, délégué aux routes et aux mobilités

**M. Guillaume Fauvet**  
Maire de Saint-Denis-lès-Bourg  
4<sup>ème</sup> Vice-Président de Grand Bourg Agglomération,  
délégué à la stratégie territoriale et au foncier

## **M. Bruno Raffin**

Conseiller de Grand Bourg Agglomération, délégué à la voirie,  
Maire de Coligny

## Présentation du contexte et des enjeux

**Mme Hélène Cédileau**

Maire de Péronnas,  
Conseillère départementale de Bourg-en-Bresse 2,  
Vice-présidente du Département de l'Ain,  
déléguée aux ressources humaines et aux sports

## Etat des lieux



### Etat des lieux :

- Insertion difficile sur la RD 117 (rocade ouest) pour les usagers de la rue J. Mermoz, aux heures de pointe ;
- Traversée non sécurisée pour les modes doux ;
- Présence régulière de convois exceptionnels desservant notamment le site d'Arcelor-Mittal

## L'objectif de l'opération : la sécurisation des déplacements



### Programme :

- **faciliter l'insertion des usagers** de la rue Mermoz sur l'axe principal (RD 117) et **sécuriser la desserte des zones urbaines** riveraines en transformant le double tourne-à-gauche en **carrefour giratoire** ;
- **sécuriser la traversée** de la RD 117 pour les modes actifs, en créant des amorces de voie verte .

## Présentation de l'opération

**M. Didier Dubourgnon**

chargé d'opérations

Service routes aménagement

Direction des routes

Département de l'Ain

Maîtrise d'ouvrage

# Présentation générale du projet



## Parti d'aménagement :

- Carrefour giratoire à 4 branches de 21 m de rayon doté d'un anneau de 8 m inter-bordures ;
- Amorces de voie verte de 3 m de large ;

# Présentation générale de l'opération - Intervenants

Maîtrise d'ouvrage : Département de l'Ain

Coût prévisionnel de l'opération : 730 160 € HT

➤ *financement* :

- Département de l'Ain : 50 %
- Grand Bourg Agglomération : 30 % ;
- Commune de Saint-Denis-lès-Bourg : 10 % ;
- Commune de Péronnas : 10 %.

Maîtrise d'œuvre : Département de l'Ain

Contact : Nicolas MOSER (suivi des travaux), agence routière de Val de Saône-Bresse

Entreprises :

- **Voirie et réseaux divers/Eclairage public** : GME EUROVIA (mandataire)/FAMY/SOBECA

Contact : Romain LOUVANCOUR (Eurovia)

- **Signalisation** : GIROD signaux + pôle régie du CD01

## Les étapes de l'opération

- **Prise en considération** : février 2019
- **Etudes** : 2020-2021
- **Convention de financement quadripartite** : juillet 2021
- **Consultation des entreprises** : de février à juin 2022
- **Acquisitions foncières (2 parcelles)** : 2022
- **Travaux** : de fin avril à mi-août 2023 (4 mois, hors intempéries)

## Présentation du planning et du séquençage des travaux

- Période de préparation : **2 mois** (de février à avril) dédiés à la réalisation des plans de phasages des travaux et d'exécution, du repérage des réseaux, des DICT, des arrêts de circulation, etc.
- Période de travaux : **4 mois** (hors intempéries) qui s'organisent comme suit :
  - ❖ **Phase 1 (4 j à compter du 25/04)** : présignalisation et balisage – effacement des marquages – rabotages des îlots ;
  - ❖ **Phase 2 (8 semaines)** :
    - démolition des futurs délaissés de chaussées pour réemploi des matériaux nobles qui les constituent (fraisât d'enrobés, graves constituant la couche de forme) ;
    - Construction du demi-giratoire ouest ;
  - ❖ **Phase 3 (4 semaines)** : Construction du demi-giratoire est ;
  - ❖ **Phase 4 (3 nuits)** : Réalisation de la couche de roulement ;
  - ❖ **Phase 5 (1 semaine)** : Finitions et signalisations horizontale, verticale et directionnelle ;

# Présignalisation aux abords du chantier



# Phase 1A – 1 j (27/04)



PHASE 1A  
DEMOLITION ILOTS ET EFFACEMENT MARQUAGE AU SOL  
DUREE = 1 JOUR

 TRAVAUX DE JOUR

 RD117 = ALTERNAT

 ST REMY = FERMEE

 PERONNAS = S.UNIQUE

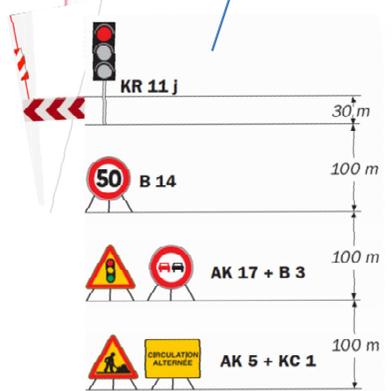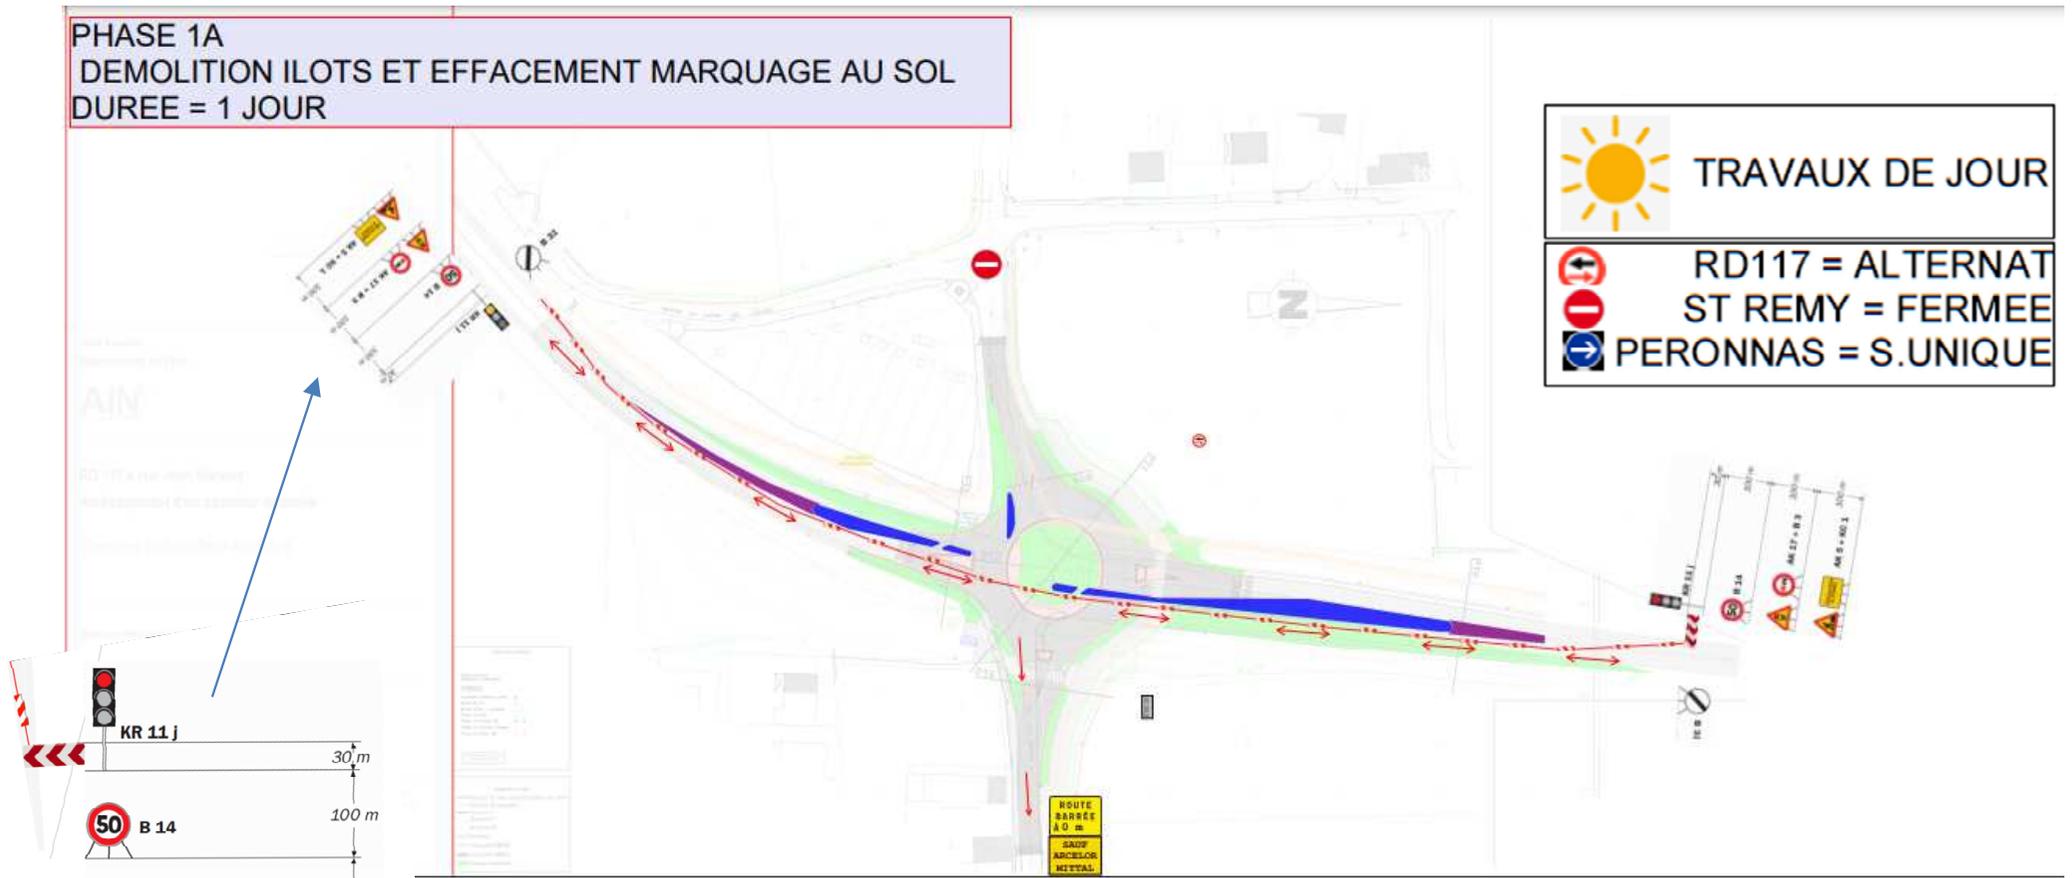

# Phase 1B – 0,5 j (28/04)

PHASE 1B  
DEMOLITION ILOTS ET EFFACEMENT MARQUAGE AU SOL  
DUREE = 0.5 JOUR





# Phase 2A - 5 semaines (début mai à début juin)

PHASE 2A  
ZONE OUEST - RESEAUX, DEMOLITION, COUCHE DE FORME  
DUREE = 5 SEMAINES



# Phase 2B – 1 semaine

**PHASE 2B**  
ZONE OUEST - BORDURES, TROTTOIRS, BETON  
DUREE = 1 SEMAINE



voies d'échange  
Département de l'Ain

**AIN**  
le Département

RD 117 x rue Jean Mermoz  
Aménagement d'un carrefour giratoire  
Commune de Saint-Denis-lès-Bourg

Dossier de consultation des entreprises  
V.2 - Plan des travaux

Nature-Catégorie  
Département de l'Ain  
0046  
Direction des routes  
Service routes aménagement  
30 Avenue République  
69100 LYON  
0378180000

Échelle	1:500 - 1:1000
Projet	
État	
Contenu	
Autres	

# Phase 2C – 1 semaine


**PHASE 2C**  
ZONE OUEST - BORDURES, TROTTOIRS, BETON  
DUREE = 1 SEMAINES





# Phase 2E – 1 semaine (fin juin)

**PHASE 2E**  
ZONE OUEST - RABOTAGE, REGLAGE, GRAVE BITUME  
DUREE = 1 SEMAINE

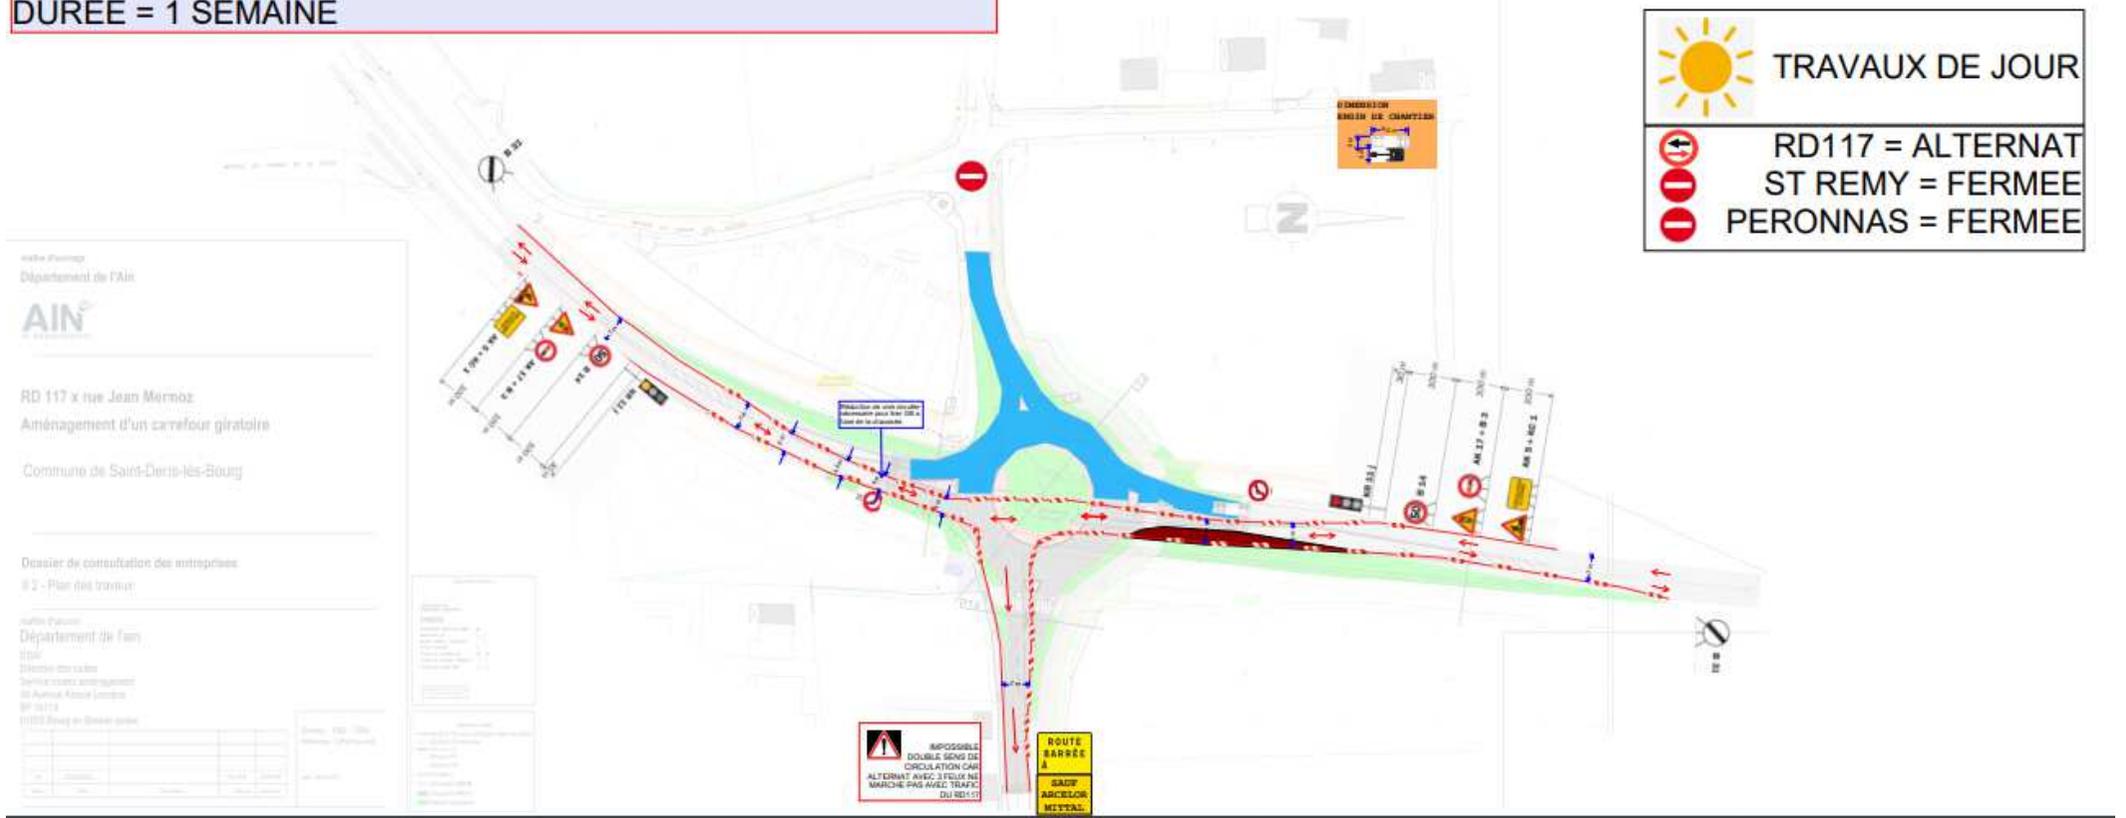



# Phase 3B – 2 semaines (du 10 au 25/07)

PHASE 3B  
ZONE OUEST - BORDURES, TROTTOIRS, BETON  
DUREE = 2 SEMAINES

Autre Ouvrage  
Département de l'Ain

**AIN**  
le Département

RD 117 x rue Jean Mermoz  
Aménagement d'un carrefour giratoire

Commune de Saint-Denis-lès-Bourg

Dossier de consultation des entreprises  
S2 - Plan des travaux

Autre Client  
Département de l'Ain  
DDE  
Direction des CLM  
Service des Aménagements  
43 Avenue André Lurieu  
BP 10114  
01100 Bourg-en-Bresse cedex

Lot	Contenu	Quantité	Unité
1	Travaux de bordures	100	m
2	Travaux de trottoirs	200	m <sup>2</sup>
3	Travaux de béton	50	m <sup>2</sup>



 TRAVAUX DE JOUR

 RD117 = ALTERNAT

 ST REMY = FERMEE

 PERONNAS = FERMEE

# Phase 3C – 3 jours

PHASE 3C  
ZONE OUEST - RABOTAGE, REGLAGE, GRAVE BITUME  
DUREE = 3 JOURS

titre d'ouvrage  
Département de l'Ain

**AIN**  
le Département


RD 117 x rue Jean Mermoz  
Aménagement d'un carrefour giratoire

Commune de Saint-Denis-lès-Bourg

Dossier de consultation des entreprises  
02 - Plan des travaux

titre d'œuvre  
Département de l'Ain  
D200  
Direction des routes  
Service routes aménagement  
45 Avenue Victor Lambert  
BP 10124  
69683 Bourg-en-Bresse cedex

date	signature	fonction

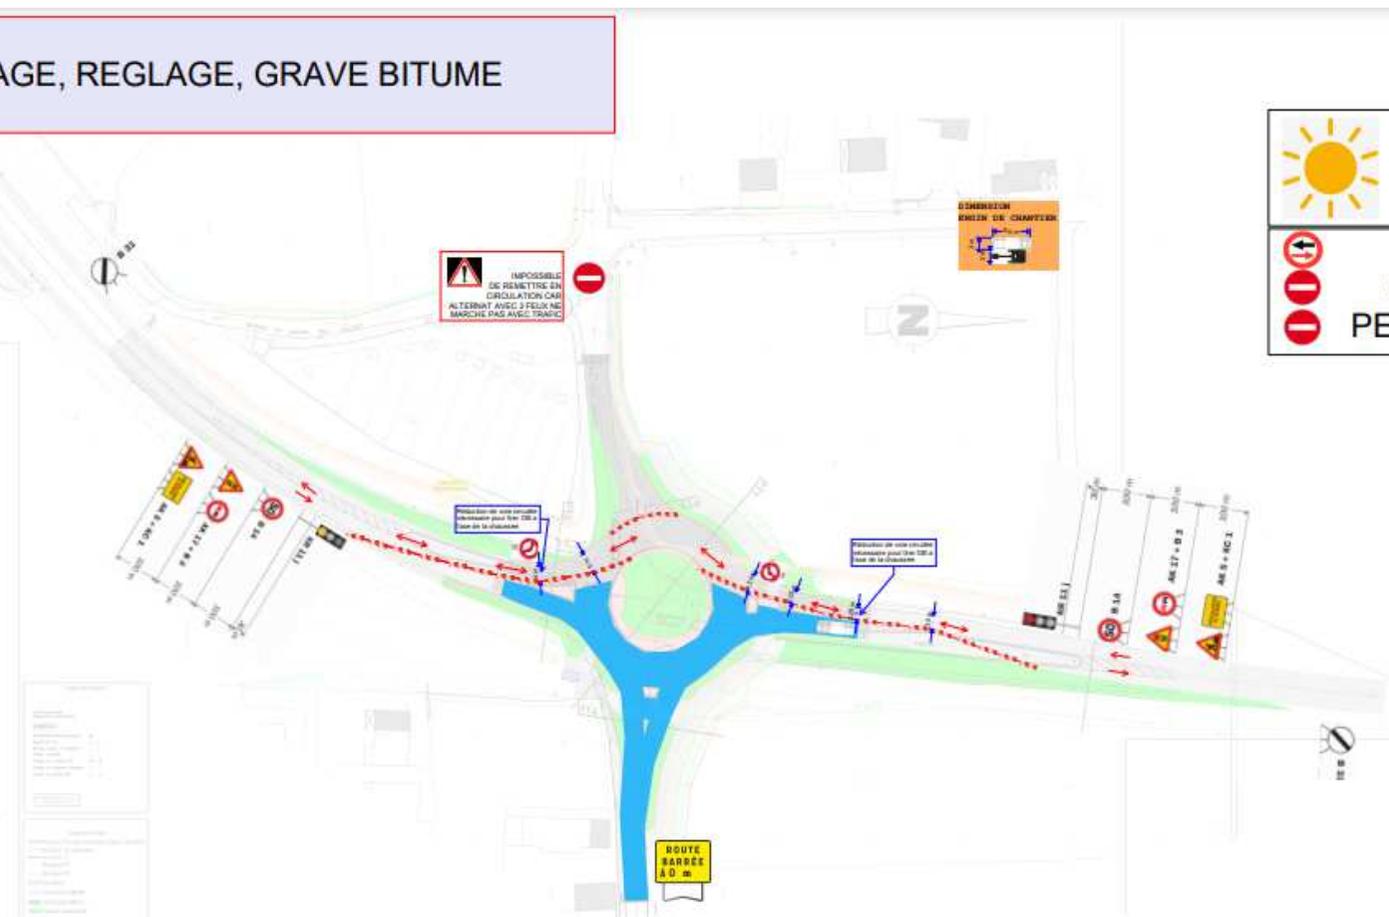

 TRAVAUX DE JOUR

 RD117 = ALTERNAT

 ST REMY = FERMEE

 PERONNAS = FERMEE

## Phase 4A – 1 nuit (1ère semaine d'août)



# Phase 4B – 2 nuits (1ère semaine d'août)

PHASE4B  
TAPIS SECTION COURANTE + SECOURS SUR GIRATOIRE  
DUREE = 2 NUITS

Voie d'accès  
Département de l'Ain

**AIN**  
le Département

RD 117 à rue Jean Mermoz  
Aménagement d'un carrefour giratoire

Commune de Saint-Denis-lès-Bourg

Dossier de consultation des entreprises  
02 - Plan des travaux

Voie d'accès  
Département de l'Ain  
0206  
Direction des routes  
Service études et aménagement  
45 Avenue Nelson Mandela  
BP 70124  
69100 Bourg-en-Bresse cedex

Lot	Description	Statut
1	Travaux de terrassement	En cours
2	Travaux de génie civil	En cours
3	Travaux de peinture	En cours
4	Travaux de signalisation	En cours
5	Travaux de végétalisation	En cours



 TRAVAUX DE NUIT

 RD117 = FERMEE

 ST REMY = FERMEE

 PERONNAS = FERMEE

## Phase 5 : finitions (Eurovia) et signalisation finale (pôle régie)



**Avez-vous des questions ?**

**Monsieur Guy Billoudet**  
Vice-Président du Département de l'Ain,  
délégué aux routes et aux mobilités

**Merci de votre présence  
et de votre attention**
